




Arne Pedersen
snedkermester a/s

Vejledende etapetidsplan for gadeside

Der tages forbehold for ændringer.

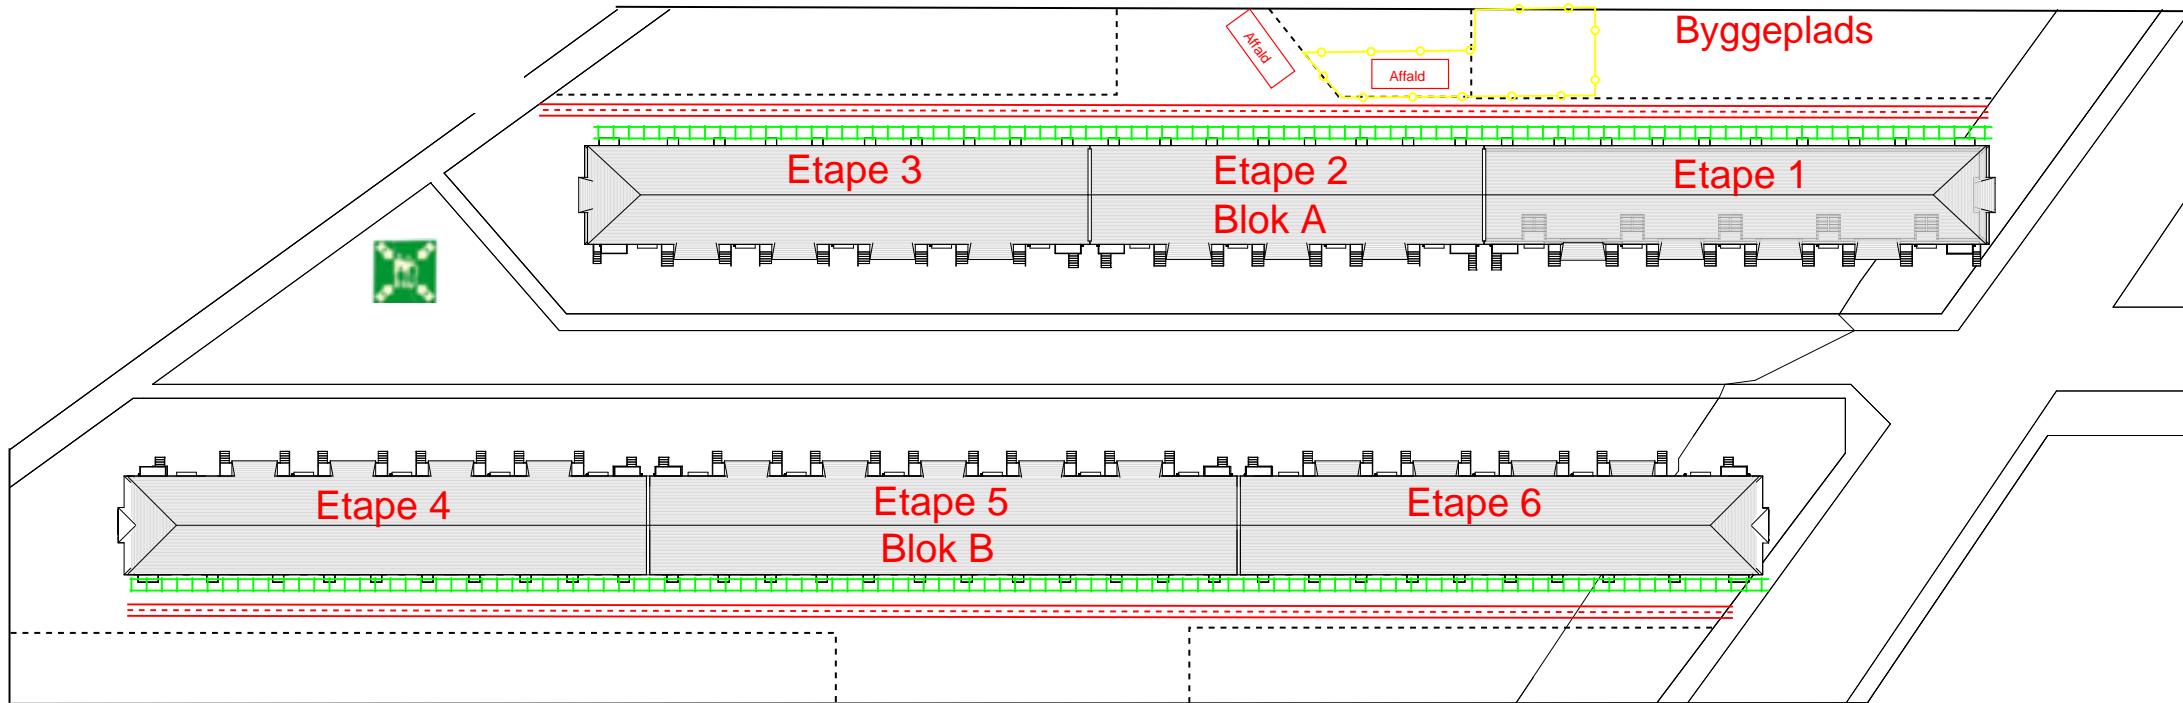

Etape 1
Johan Kellers Vej 24-32
Byggeperiode uge: 1-15

Etape 2
Johan Kellers Vej 34-40
Byggeperiode uge: 6-23

Etape 3
Johan Kellers Vej 42-50
Byggeperiode uge: 11-28

Etape 4
Johan Kellers Vej 55-63
Byggeperiode uge: 17-35

Etape 5
Johan Kellers Vej 43-53
Byggeperiode uge: 23-40

Etape 6
Johan Kellers Vej 33-41
Byggeperiode uge: 29-47

Den vejledende angivet byggeperiode pr. etape inkludere stillads montage, bygningsarbejder ifm. karnapper og altaner, samt stillads demontering. udv. følgearbejder ved terræn samt renovering af gavle er ikke inkluderet.
